Bürgerinformation zur Ortsumgehung Twiste

Baudurchführung / möglicher Bauablauf

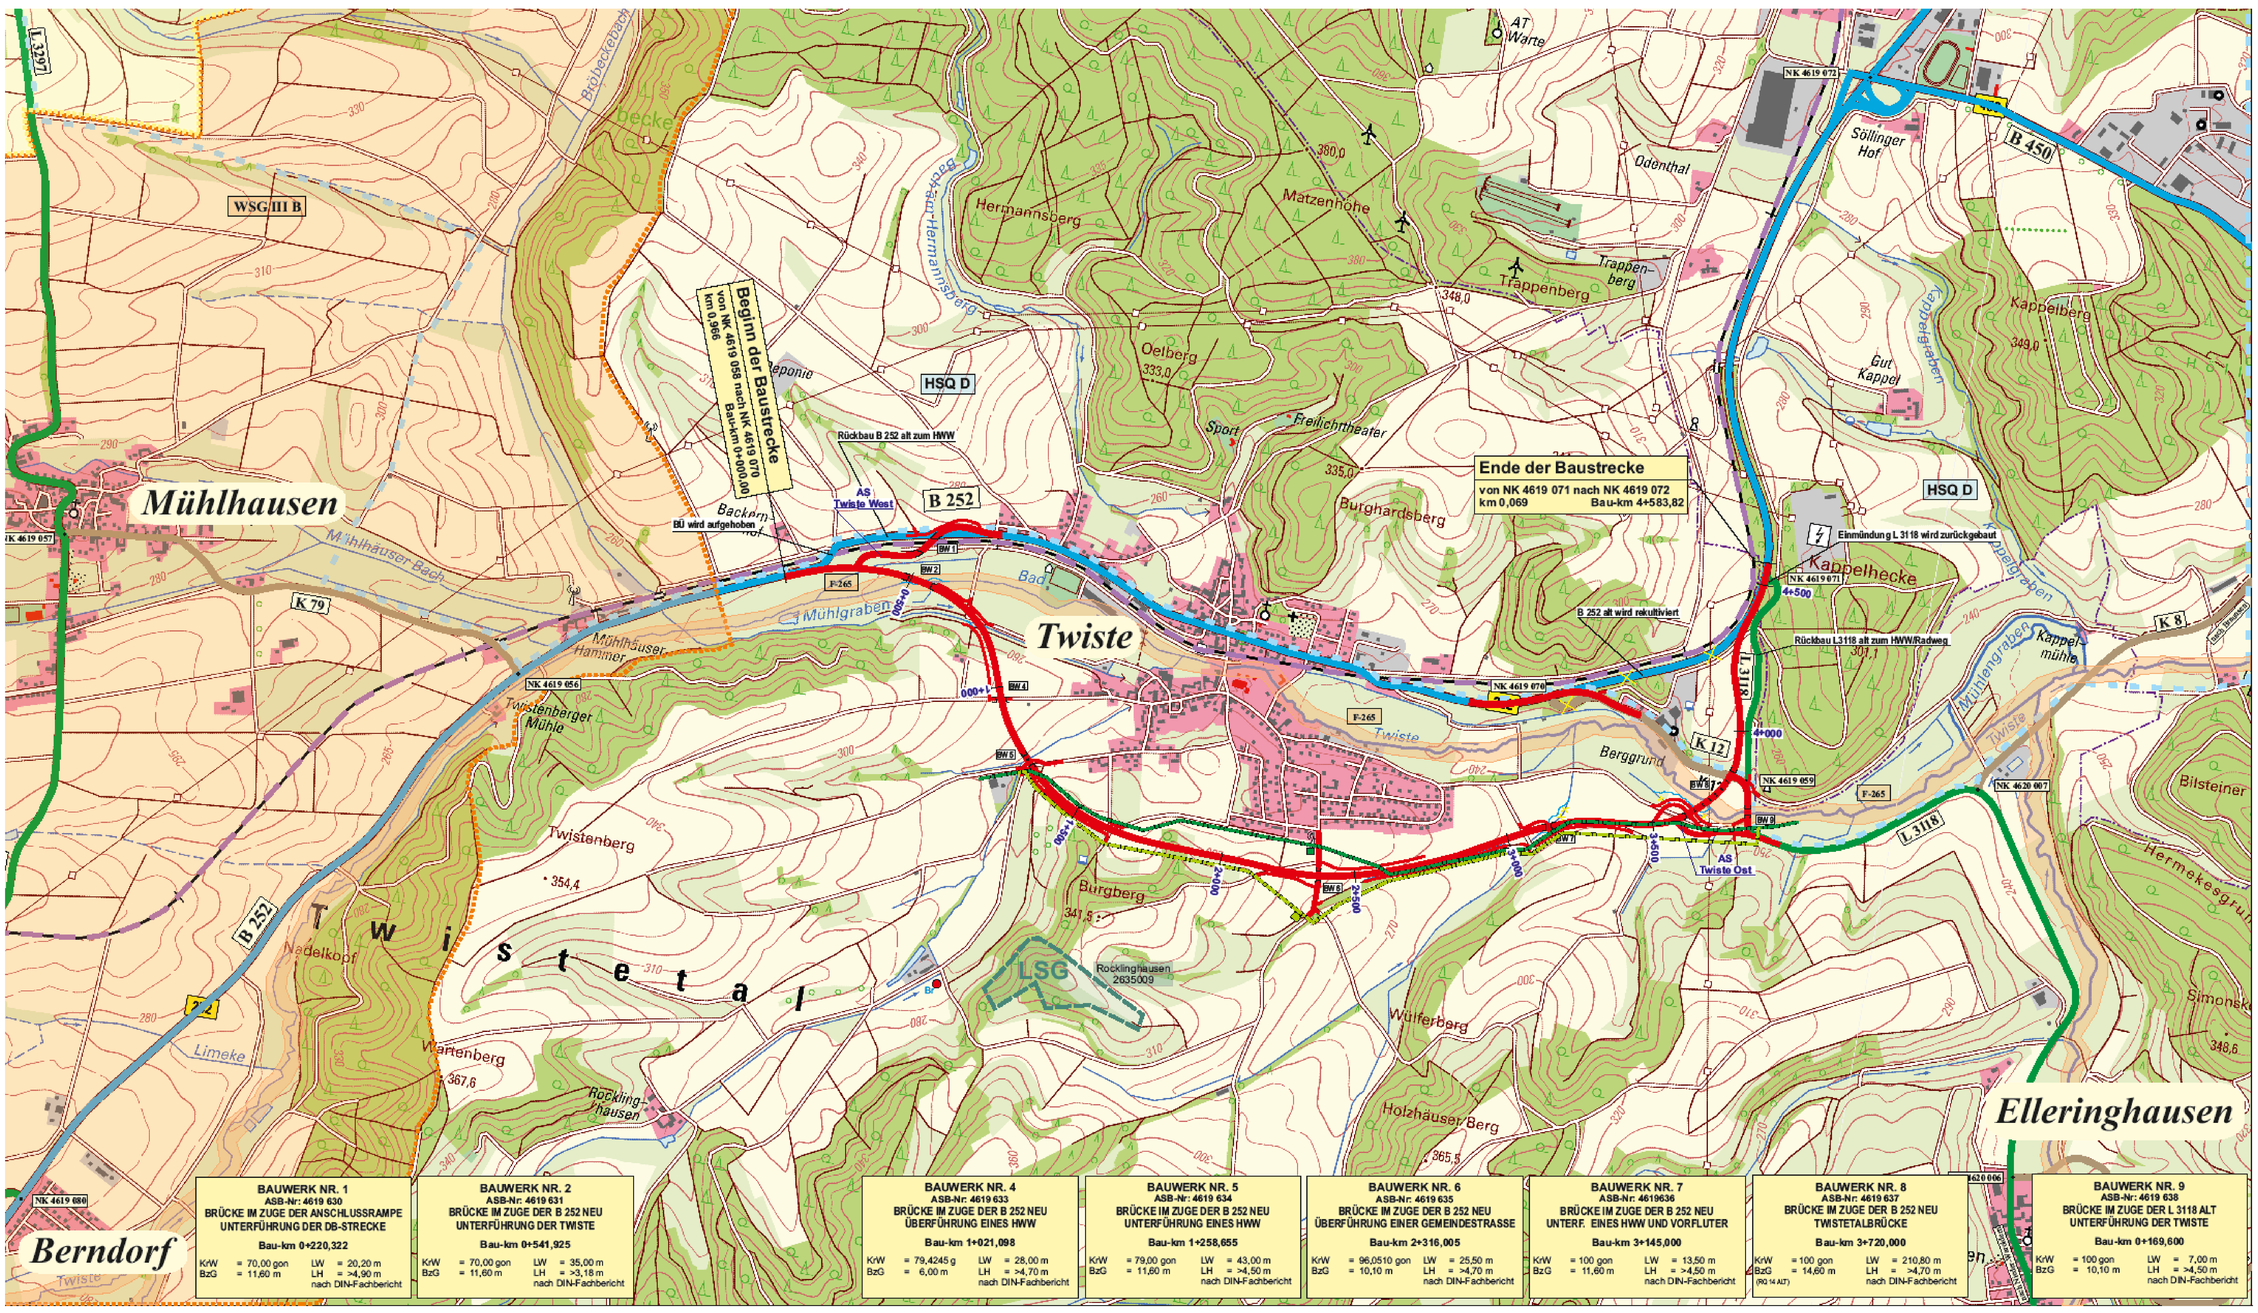

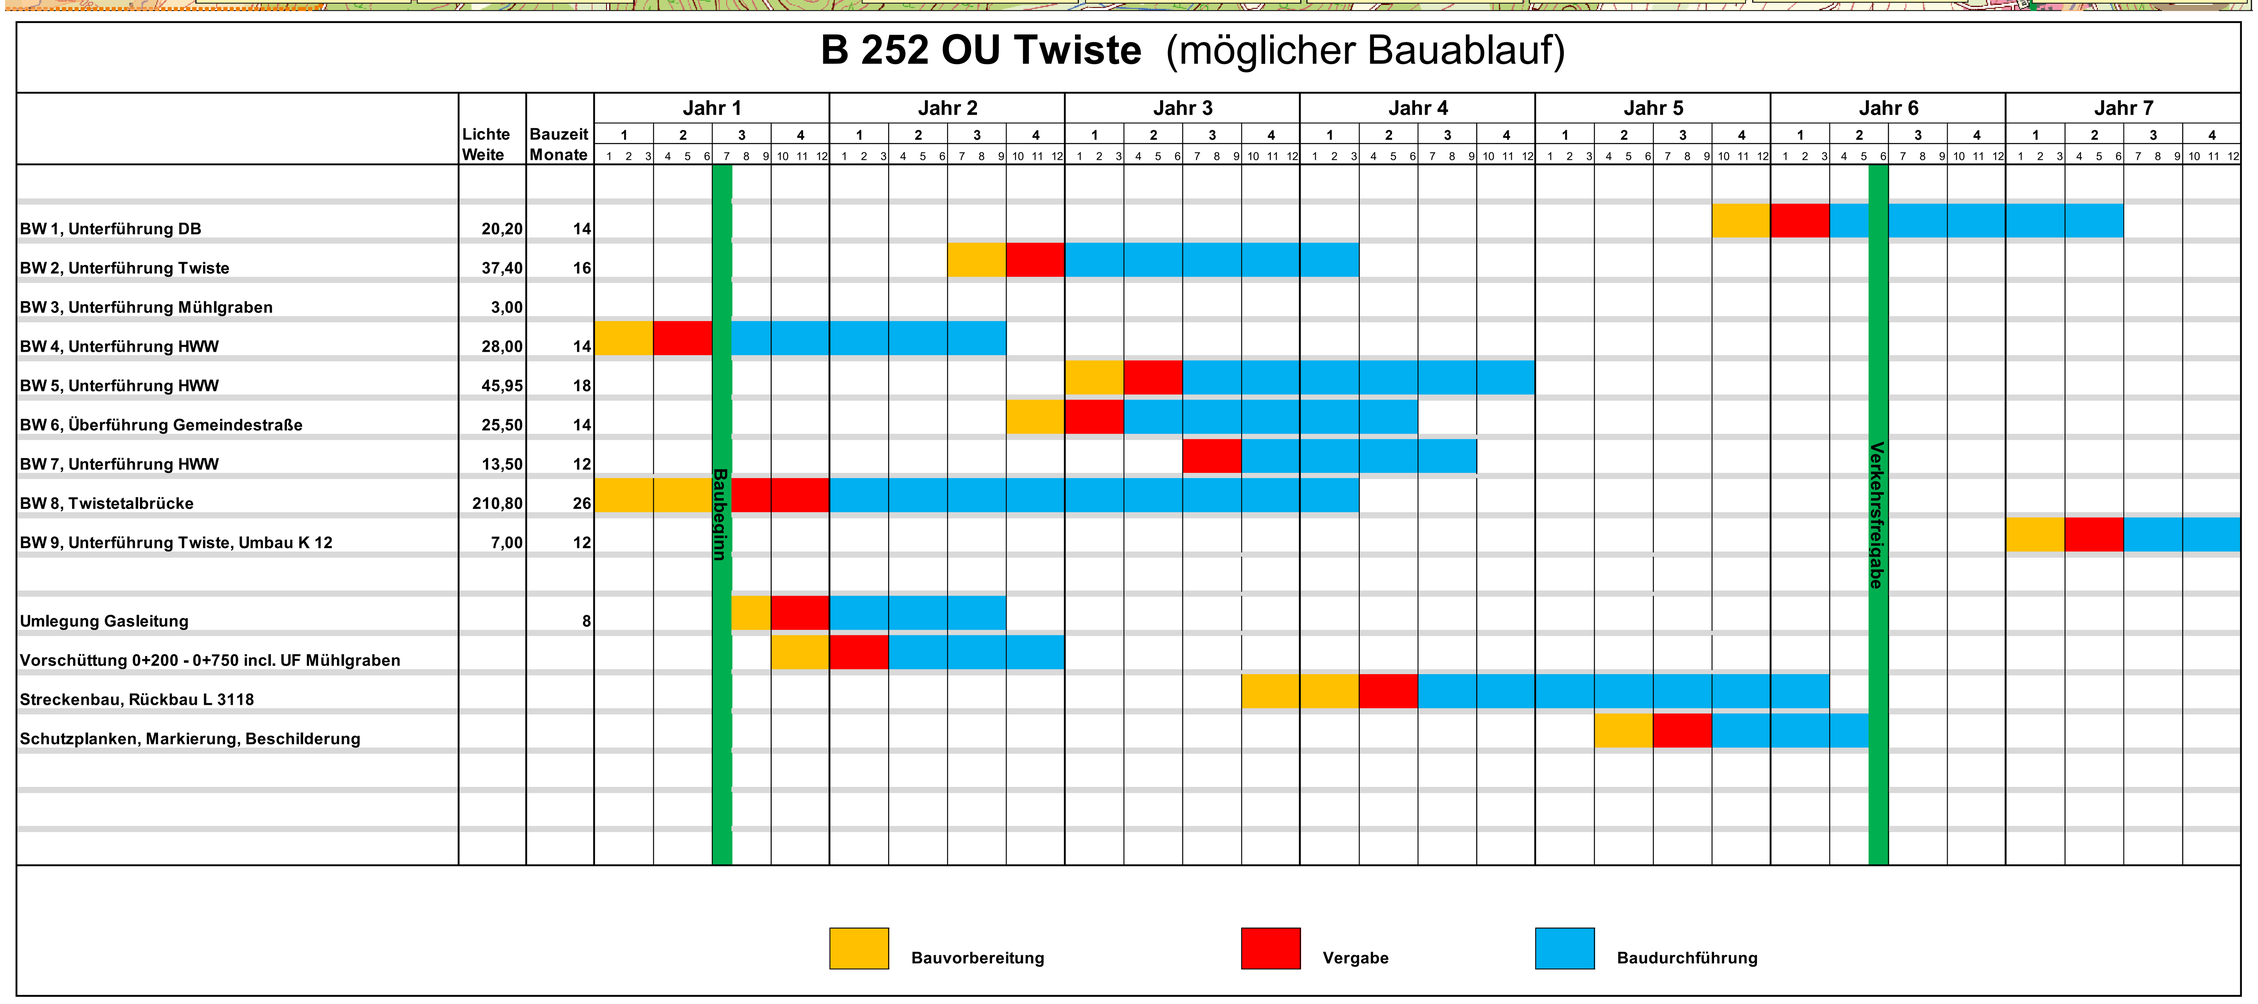

Es werden zunächst die Bauwerke gebaut und die Gasleitung umgelegt. Ebenso soll der Damm beidseits der Twistebrücke (Bauwerk 2) wegen zu erwartender Setzungen frühzeitig hergestellt werden. Die östliche Twistebrücke (Bauwerk 8) muss wegen der langen Bauzeit frühzeitig begonnen werden. Die Bauwerke 1 und 9 liegen nicht auf der Trasse der Umgehung und werden gegen Ende der Baumaßnahme errichtet.
Für die Erstellung der Bauwerke ist teilweise mit Baustellenverkehr durch die Ortslage zu rechnen. Die Bauarbeiten für den Erd- und Straßenbau erfolgen im Bereich der neuen Umgehungsstraße. Hierbei soll das vorhandene Straßen- und Wegenetz nicht wesentlich genutzt werden.
Für die Herstellung der Straßenanschlüsse an die bestehende Bundesstraße im Westen und Osten muss die Bundesstraße jeweils für kurze Zeit (max. 2 Monate) voll gesperrt werden.
Die L 3118 aus Richtung Elleringhausen muss für die Umlegung der Gasleitung und für die Herstellung des Anschlusses jeweils kurzzeitig gesperrt werden.
